Утверждаю:
Главный инженер Рязанской дистанции пути

30.09.2019 _____ О.В. Корчагин

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТА РАБОТ НА ОХРАНЯЕМОМ ЖЕЛЕЖНОДОРОЖНОМ ПЕРЕЕЗДЕ 185 км станции Рыбное

Название организации: Рязанская дистанция пути.
Название объекта: переезд 185кмПК1 станция Рыбное
Вид и характер работ: асфальтировка переезда
Срок исполнения работ: 3 и 4 октября 2019г. С 8-00 до 16-00
Ответственные за проведение работ: заместитель начальника дистанции Ненастин А.В.

Информация на щите.
На переезде 185км 3 и 4 октября 2019г. будет затруднено движение автотранспорта, в связи с ремонтными работами. Выбирайте заранее маршрут движения.

Два Инф.щит устанавливается на пересечение ул. Центральной, Почтовой и а/д. 61Н-403

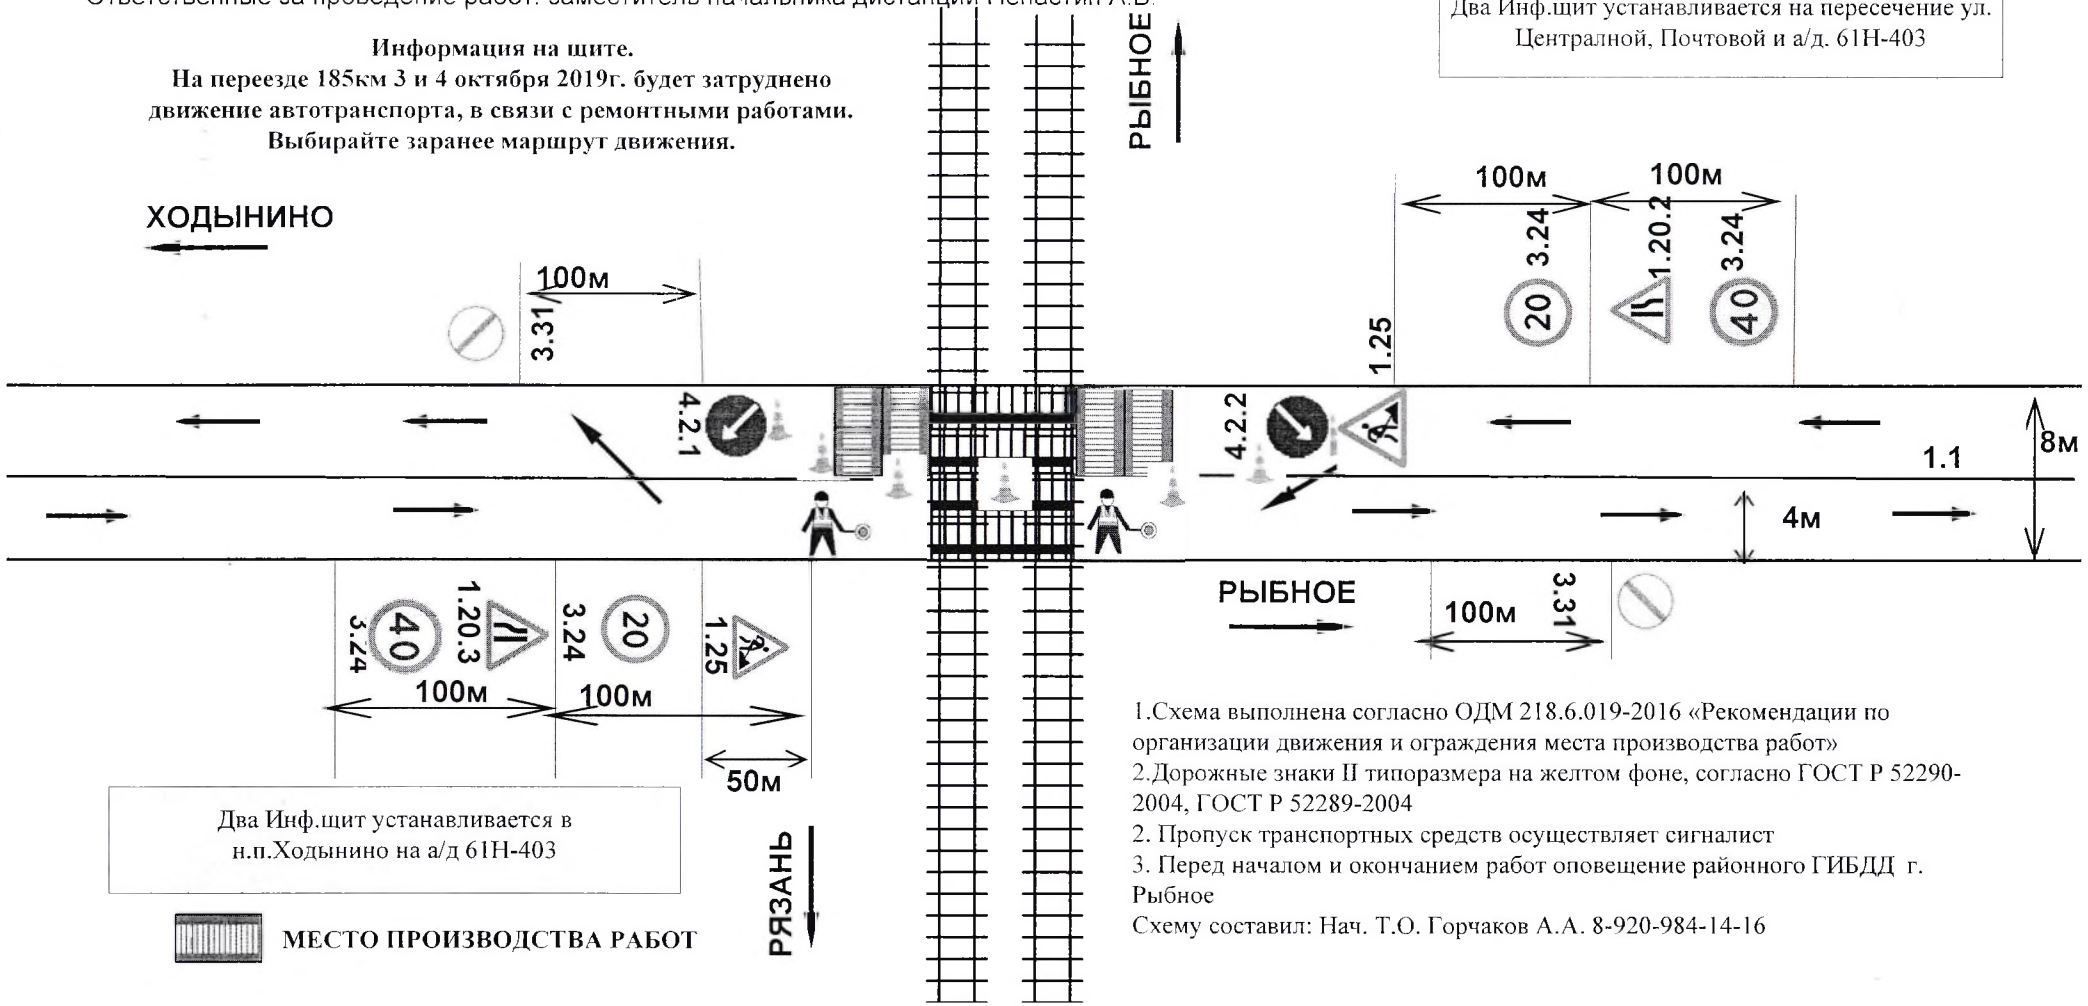

Два Инф.щит устанавливается в н.п.Ходынино на а/д 61Н-403

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1.Схема выполнена согласно ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждения места производства работ»
2.Дорожные знаки II типоразмера на желтом фоне, согласно ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 52289-2004
2. Пропуск транспортных средств осуществляет сигналист
3. Перед началом и окончанием работ оповещение районного ГИБДД г. Рыбное
Схему составил: Нач. Т.О. Горчаков А.А. 8-920-984-14-16
